

Steiner Rohr- u. Kanalreinigung

Druckprüfung- TV-Untersuchung- Kanalsanierung-Fräsröbter

Josef-Christianstraße 35

88499 Riedlingen

Tel.: 07371/927910 Fax.: 07371/9279125

Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 (Verfahren Luft)

Auftraggeber:
Straße:
Ort:

Tele:

Bauvorhaben: Neubau Waschblatte
Prüfobjekt: Abscheideanlage
Straße:
Ort:
Prüfabschnitt: Ablauf Abscheider
von Schacht: Ölabscheider
nach Schacht: Übergabeschacht bzw. Kontrollschacht
Ölabscheider u. Schlammfang ca. 5 m³


Haltung: Schmutzwasser
Material: Kunststoff
Querschnitt: Kreis
AbmaÙe: 200 mm
Länge: 25.00 m

Prüfverfahren: Rohrleitungsprüfung
Prüfzeit: 1.5 min
Beginn Füllen: 27.11.2018 09:25:45
Beginn Prüfung: 27.11.2018 09:30:59
Prüfungsende nach: 1.5 min
Prüfresultat: **Prüfung bestanden**
Prüfer: Steiner

Prüfdruck: 200.0 mbar
zul. Druckabfall: 15.0 mbar
bei Druckwert: 0.0 mbar
bei Druckwert: 208.6 mbar
Druckabfall: 1.3 mbar

Prüfgerät ROHRTEST: RT4 #150604

Bemerkung: Bestanden
Protokolldatei: 181127092545.DAT

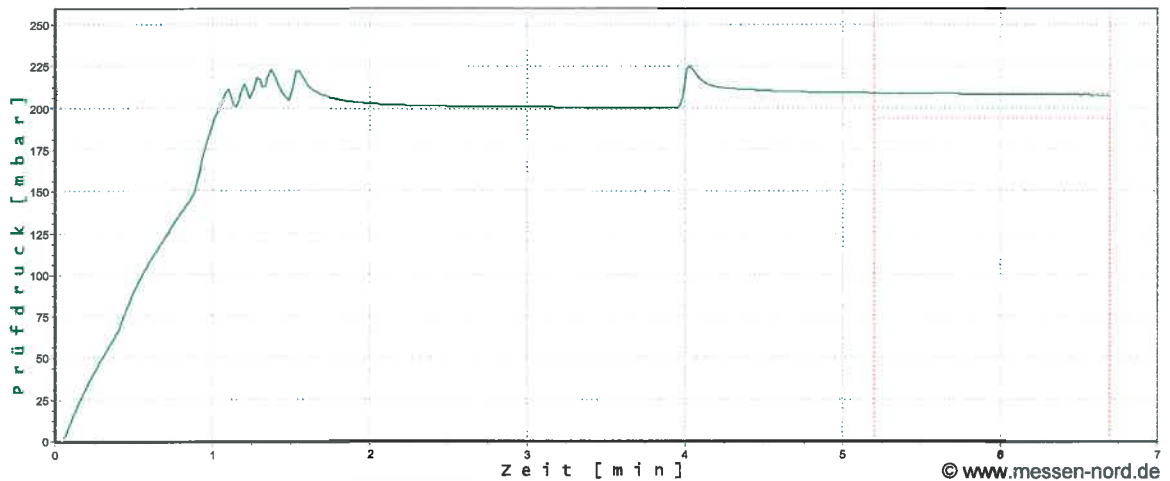

Prüfdatum:Prüfer:Auftraggeber:
